



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż systemów suchej zabudowy**
Oznaczenie arkusza: **B.05-01-17.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.05**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Numer stanowiska					
Rezultat 1. Szkielet ścianki działowej		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Uwaga: Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny.							
1	Profil UW 50 podklejony taśmą akustyczną						
2	Profil UW 50 zamocowany stabilnie do podłogi kołkami SM 6 × 60 o rozstawie nieprzekraczającym 50 cm						
3	Profil CW 50 podklejony taśmą akustyczną						
4	Profil CW 50 zamocowany stabilnie do ściany kołkami SM 6 × 60 o rozstawie nieprzekraczającym 50 cm						
5	Szkielet wykonany z profili UW 50 oraz CW 50 w miejscu zgodnie z rysunkiem, z dopuszczalnym odchyleniem od wymiarów ±2 cm						
6	Szkielet wykonany na wysokość 120 cm						
7	Rozstaw profili CW 50 nie przekracza 60 cm w osiach						
8	Profile CW 50 zamontowane w pionie ±10 mm na całej wysokości ścianki w obu kierunkach						
9	Profile UW 50 zamontowane w poziomie ±10 mm na szerokości poszczególnych fragmentów ścianki						
10	Szkielet wykonany pod kątem prostym w stosunku do istniejącej ściany oraz pomiędzy fragmentami ścianki działowej, z dopuszczalnym odchyleniem ±5 mm						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Opłytywanie ścianki działowej

1	Pozostawiona szczelina dylatacyjna pomiędzy podłogą a płytami gipsowo-kartonowymi ma szerokość 10 mm $\pm$ 5mm						
2	Dłuższy fragment ścianki opłytywany płytą GKB (zwykła)						
3	Krótszy fragment ścianki opłytywany płytą GKBI (zielona)						
4	Płyty przykręcone do profili blachowkrętami 3,5 × 25 mm w rozstawie 25 cm $\pm$ 2 cm						
5	Opłytywanie wykonane jednostronnie zgodnie z rysunkiem						
6	Łby wszystkich wkrętów nie wystają poza lico płyty						
7	Łby wszystkich wkrętów nie przebijają kartonu płyty						

Rezultat 3. Izolacja akustyczna ścianki działowej

1	Ułożona wełna mineralna o grubości 50 mm w dłuższym fragmencie ścianki						
2	Ułożona wełna mineralna o grubości 50 mm w krótszym fragmencie ścianki						
3	Wełna mineralna ułożona na całej powierzchni obu fragmentów ścianki						
4	Wełna mineralna szczelnie przylega do profili						
5	Płyty wełny mineralnej szczelnie przylegają do siebie						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Wykonywanie ścianki działowej z izolacją akustyczną

Zdający

1	stosował narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem						
2	miał założone okulary ochronne podczas wiercenia otworów w podłożu						
3	miał założone rękawice podczas przycinania profili szkieletu						
4	miał założoną maskę przeciwpyłową i rękawice podczas montażu płyt z wełny mineralnej						
5	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt						
6	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko pracy						
7	usunął odpady do odpowiednich pojemników na odpady						


Egzaminator

imię i nazwisko


.....

data i czytelny podpis

PRZESZKÓJ POZIOMY I-I

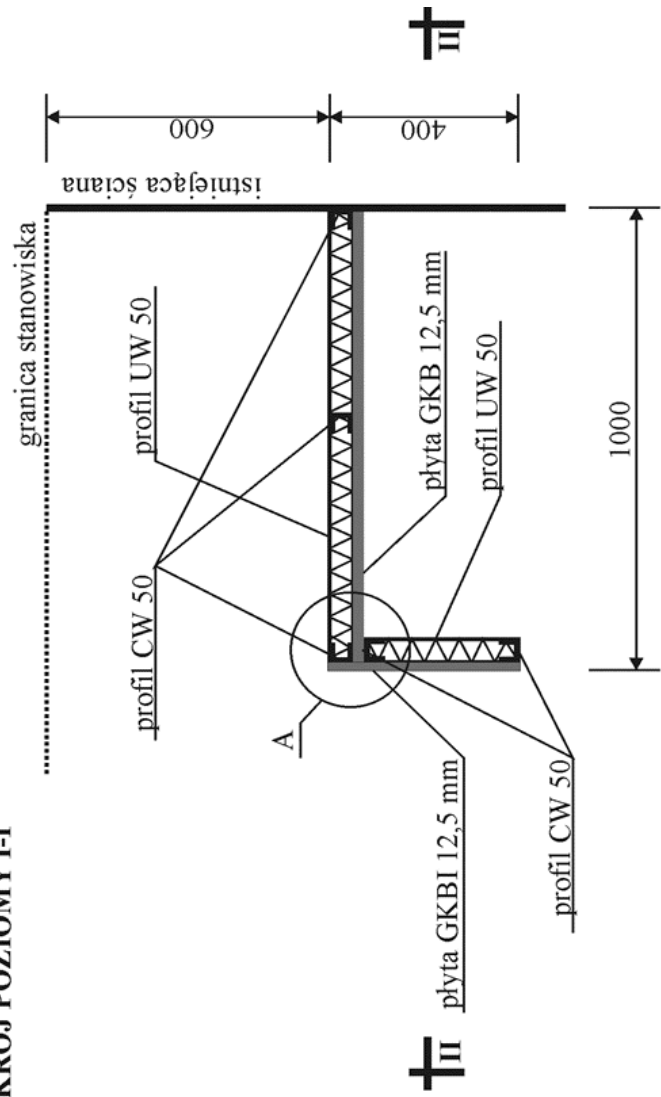

PRZESZKÓJ PIONOWY II-II

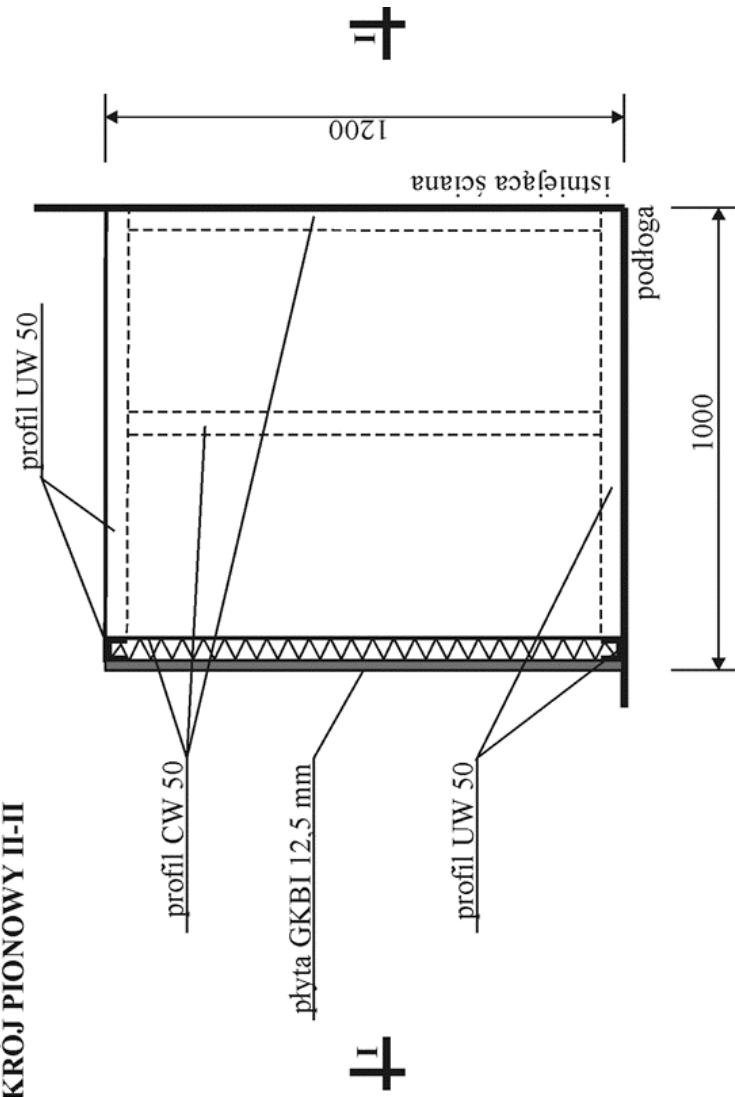

SZCZEGÓŁ A-A

